



08.01.2019:

INFORMASJON OM BYGGEARBEIDENE

Vi har hatt en god fremdrift i prosjektene. Flerbrukshallen vil ferdigstilles tidligere enn planlagt, og der er det nå svært hektisk men vi har tro på at vi kommer i mål til uke 9.

Nå pågår montering av div. utstyr og igangkjøring og testing av tekniske anlegg. I hovedsak er det meste av det bygningsmessige på plass. Parken over hallen vil ikke bli ferdigstilt til uke 9 da man ikke kan plante osv. i vinterhalvåret. Parken ferdigstilles til skolestart 2019. Inngangen mot skolegården og trappen ved administrasjonsbygget er nå nærmest ferdigstilt og skal åpnes i uke 9/2019, slik at elever og brukere på kvelden får en grei tilkomst til hallen.



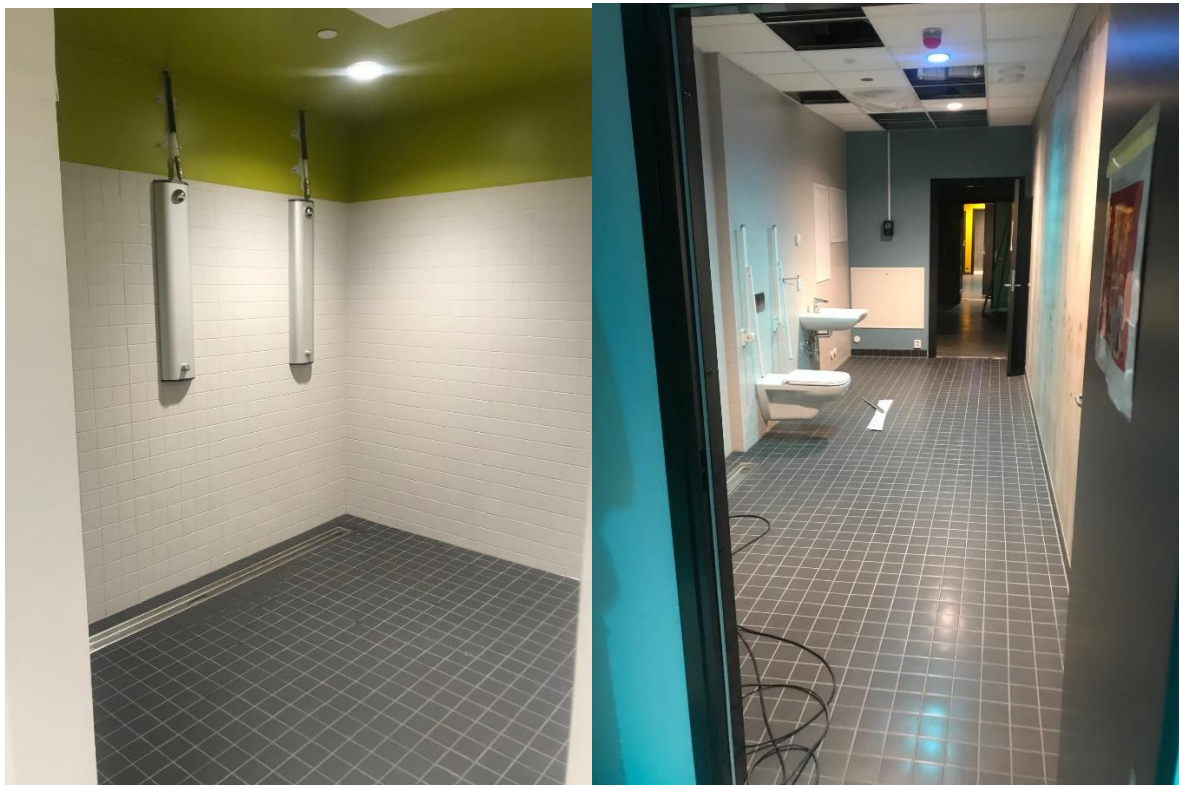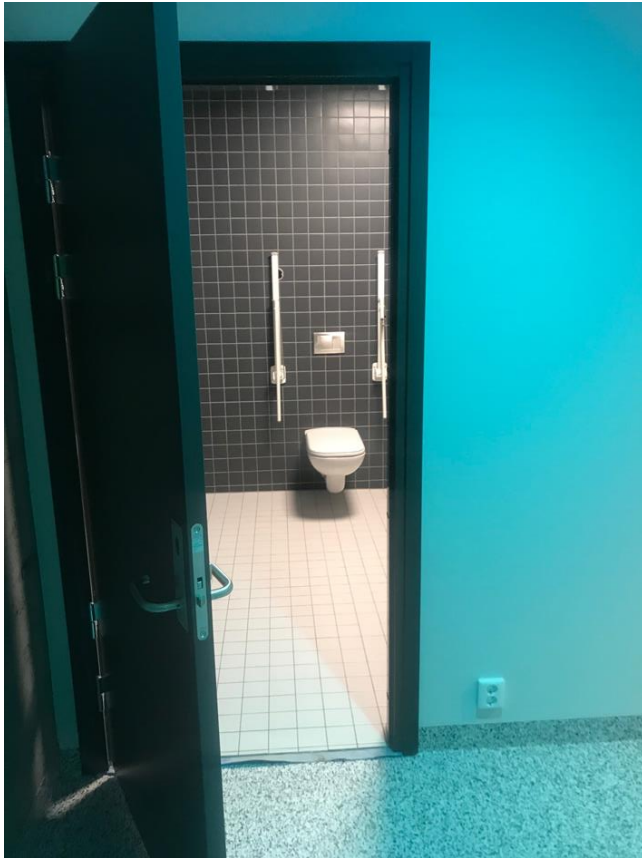

På skoleprosjektet går det også bra. Der holder vi på med kompletterende arbeider innvendig og skal 1. mars igangkjøre alle tekniske anlegg. På skolen er vi på plan og vil ferdigstille prosjektet som planlagt til skolestart sommer 2019.



Sikkerhet:

Vi har stort fokus på sikkerhet. Vi har mange leveranser til prosjektene og ser at dette krever tett oppfølging, både fra oss og skolen. Dette har gått bra til nå, men vi har sett noen situasjoner med trafikk som vi fortsetter å følge opp. Takk for godt samarbeid så langt. Kontakt oss dersom dere ser noe som vi bør følge bedre opp.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede på 90851286.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder
