


08.10.2018:

INFORMASJON OM BYGGEARBEIDENE

Gledelige nyheter på Uranienborg Skole!

Vi har hatt en god fremdrift i prosjektene. Flerbrukshallen vil ferdigstilles tidligere enn planlagt. I uke 9, etter vinterferien i 2019 skal hallen være klar til å tas i bruk.

Nå pågår montering av tekniske anlegg, bygging av støttemur ved bygg 3 og ventilasjonstårn. Vegger og himlinger ferdigstilles og vi går inn i en fase med kompletterende arbeider. Parken over hallen vil ikke bli ferdigstilt til uke 9 da man ikke kan plante osv. i vinterhalvåret. Parken ferdigstilles til skolestart 2019. Inngangen mot skolegården og trappen ved administrasjonsbygget ferdigstilles til uke 9/2019, slik at elever og brukere på kvelden får en grei tilkomst til hallen.

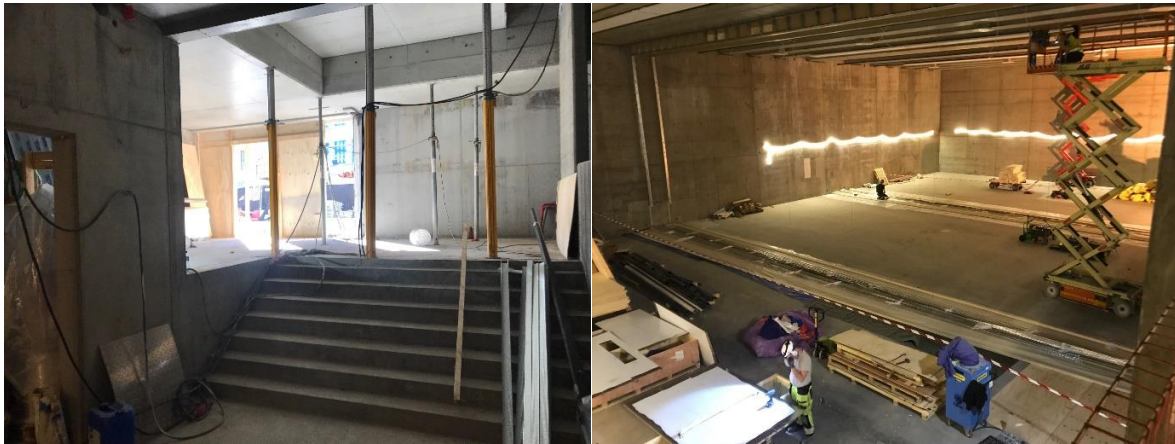

På skoleprosjektet går det også bra. De siste ventilasjonsaggregatene monteres ila oktober. Teknikken i etasjene begynner å komme på plass og maler og murer er godt i gang med sine kompletterende arbeider. På skolen er vi på plan og vil ferdigstille prosjektet som planlagt til skolestart sommer 2019.





Sikkerhet:

Vi har stort fokus på sikkerhet. Vi har mange leveranser til prosjektene og ser at dette krever tett oppfølging, både fra oss og skolen. Dette har gått bra til nå, men vi har sett noen situasjoner med trafikk som vi fortsetter å følge opp. Takk for godt samarbeid så langt. Kontakt oss dersom dere ser noe som vi bør følge bedre opp.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede på 90851286.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt

prosjektleder
